



Be Right VZW
BE1006.872.569
Kerkstraat 71
9250 Waasmunster

Tel. 052 21 53 46
info@ber1ght.be
www.ber1ght.be



762-INSP

Inspectie verslag van een oude/bestaande huishoudelijke elektrische installatie

Algemene Informatie

Datum controle: 2026-02-25T14:45:00 Agent-bezoeker: De Pauw Jelle
Mentor: - Merk & Type: Metrel EurotestXD
Datum uitgave: 2026-02-25T14:45:00 Serienummer: 24080645

Plaats van onderzoek

Straatnaam Mandekensstraat
Huisnummer 201
Busnummer
Postcode 9255
Gemeente Buggenhout
Land Belgium

Opdrachtgever

Naam Keurmeesters -
Adres
Mail info@keurmeesters.be
Telefoonnummer 0473821269

Controle Informatie

Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3


Netbeheerder: Fluvius	Spanning: 3N400V	Meter / bord verbinding: 10mm ²	Max beveiliging (A): 20A
EAN Nummer: 541448820063065723	Teller Nummer: 1LGZ0577243078	Aantal borden: 1	Aantal kringen: 17

Aardelektrode: aardingspen verticaal in de grond

RI Algemeen: 0.72MΩ
Ok

Continuïteit
NotOk

RE: 18.84Ω
Ok

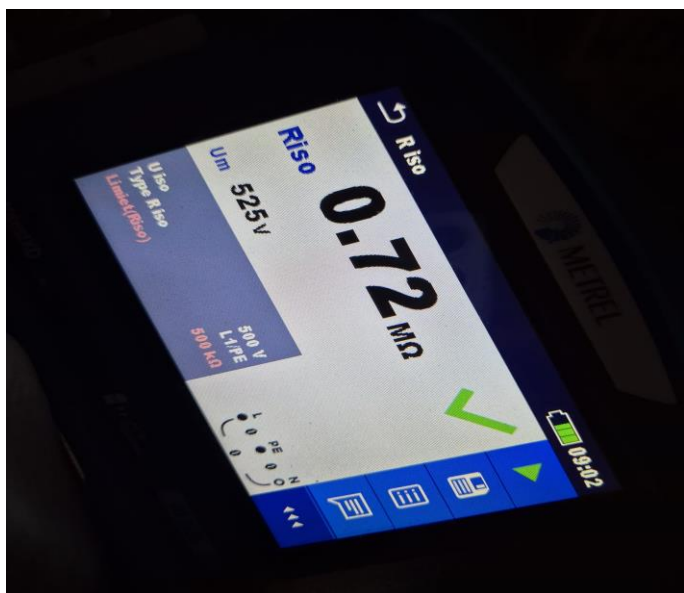

Technische Informatie

Type gebouw: Woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord



Differentieelstroominrichting

IA (mA)	In (A)	I ² t	Type	Beveiligde Kringen	Test	RCD
300mA	40A	22.5kA2s (3000)	A	17	OK	OK
30mA	63A	22.5kA2s (3000)	A	8	OK	OK

Beschrijving Installatie

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
4	C	16	-	2	1.5mm ²
11	C	20	-	2	1.5mm ²
1	C	20	reserve	2	2.5mm ²
1	C	32	-	2	6mm ²

Schema's: NotOk
Testen: NotOk
Kabels/connecties: Ok

Verdeelbord: Ok
Transformatoren: N/A
Differentieelstroominrichting: Ok

Vermogensschakelaar(s): Ok
Aarding/Equipotentiale verbindingen: Ok
Toestellen, contactdozen/schakelaar: Ok

Opmerkingen, Nota's en Besluit

1.01 Ééndraadsschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)


1.02 Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)

2.02 De continuïteit van equipotentiaal en/of beschermingsgeleiders zijn niet gewaarborgd. (Boek 1 Onderafdeling 5.3.5.3.G en 5.4.3.5)

AFGEKEURD: De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 – AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor exact 1 jaar na datum van dit rapport.

Extra opmerking(en):

Handtekening Controleagent:

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke. To the right of the signature, the number "#1" is written in a simple, blocky font.

Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole herinnert aan de volgende voorschriften van het Boek 1:

- a) de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
