


Technische Informatie

Type gebouw: Woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord

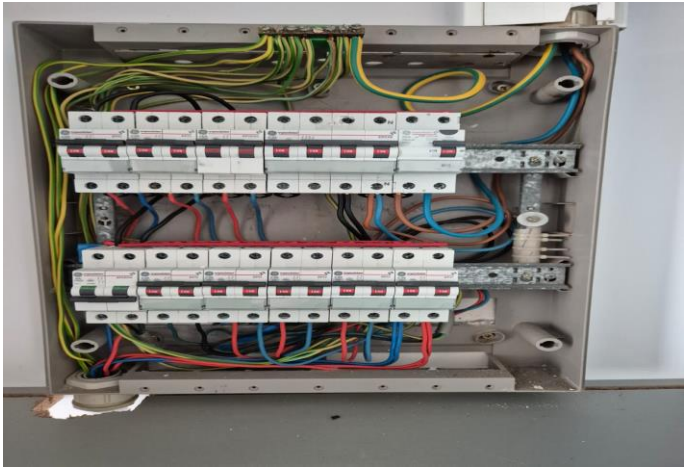

Differentieelstroominrichting

IΔ (mA)	In (A)	I²t	Type	Beveiligde Kringen	Test	RCD
300mA	40A	22.5kA2s (3000)	A	19	OK	OK
30mA	40A	22.5kA2s (3000)	A	2	OK	OK
30mA	40A	22.5kA2s (3000)	A	10	OK	OK

Beschrijving Installatie

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
11	C	20	-	2	2.5mm²
4	C	16	-	2	2.5mm²
2	C	16	-	2	1.5mm²
1	C	32	-	2	6mm²
1	C	6	-	2	2.5mm²

Schema's: Ok	Verdeelbord: Ok	Vermogensschakelaar(s): Ok
Testen: Ok	Transformatoren: Ok	Aarding/Equipotentiale verbindingen: Ok
Kabels/connecties: Ok	Differentieelstroominrichting: Ok	Toestellen, contactdozen/schakelaar: Ok

Opmerkingen, Nota's en Besluit

GOEDGEKEURD: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 – AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 2051-08-25

Extra opmerking(en):

Handtekening Controleagent:

Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole herinnert aan de volgende voorschriften van het Boek 1:

- a) de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
